


03

INSTALLATION D'HYGIÈNE BASE VIE MODULAIRE

ÉTAT DES LIEUX



PRÉSENTATION DE LA BASE VIE



PRÉSENCE DE LA BASE VIE TOUT AU LONG DU CHANTIER



Démolition



Travaux



Livraison

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



- ✓ Protections collectives en toiture
- ✓ Escalier d'accès débouchant en toiture

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Accès bétonnés et abords des cantonnements




PRÉSENTATION DE LA BASE VIE 5 MODULES POUR 16 PERSONNES



**5 Bungalows
pour
16 Salariés**

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

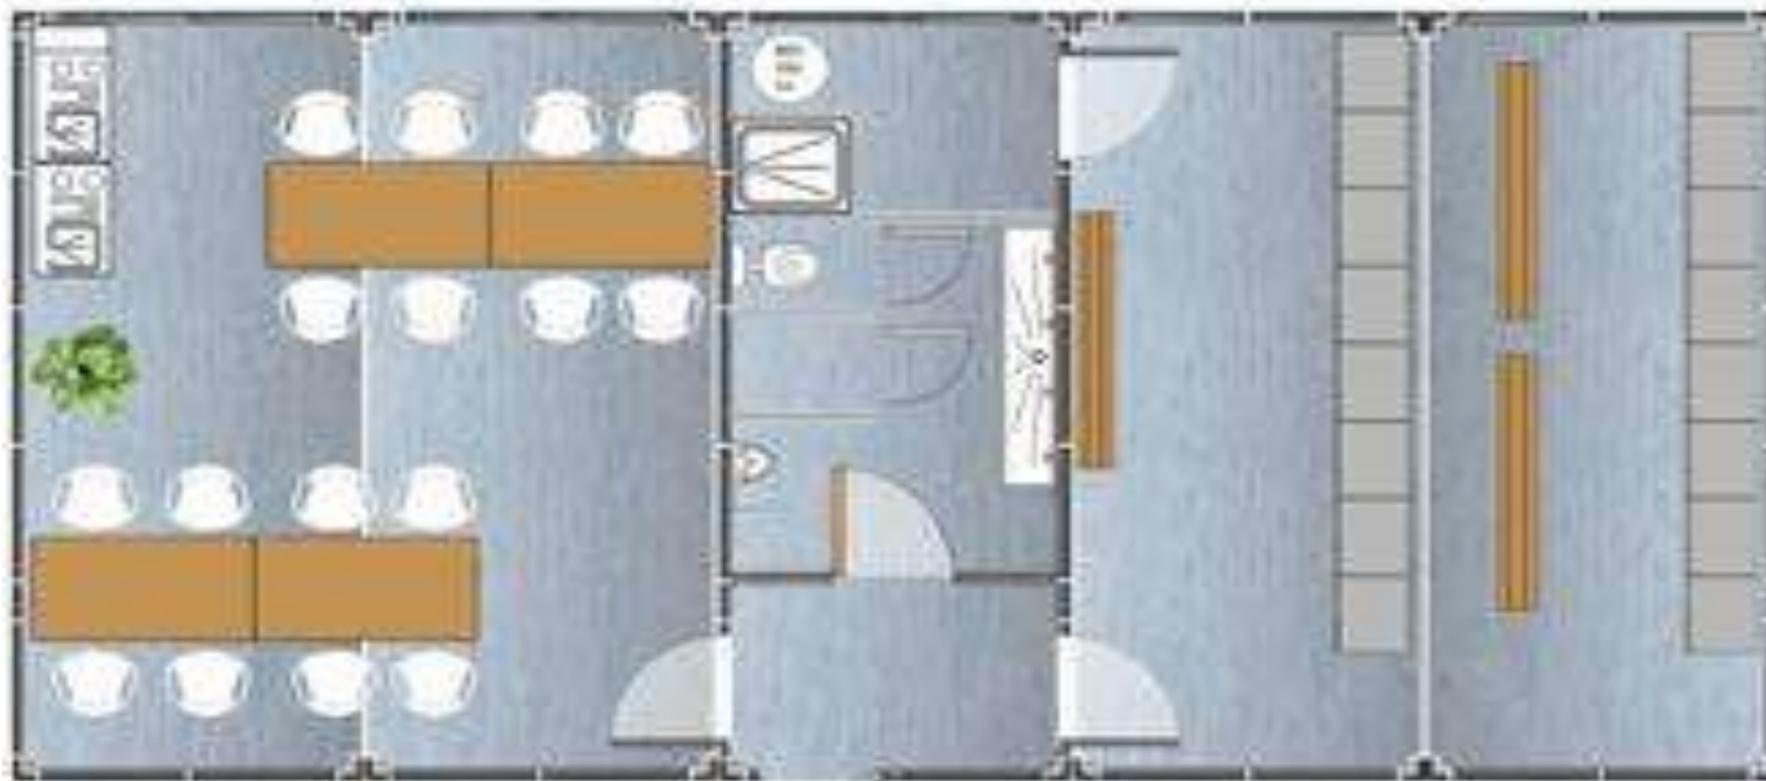

**5 Bungalows
pour
16 Salariés**

8

2 Modules Réfectoires

1 Module sanitaire

2 Modules Vestiaires



**l'Assurance
Maladie**
RISQUES PROFESSIONNELS

Caisse régionale
Île-de-France

RÉFECTOIRES



- ✓ 4 tables
- ✓ 16 chaises
- ✓ 2 évier avec rangements
- ✓ 2 plaques chauffantes
- ✓ 2 réfrigérateurs
- ✓ 2 micro-ondes
- ✓ 1 chauffe gamelle



Crédits photos @Cramif

VESTIAIRES



- ✓ 16 Armoires à double compartiments, ventilées avec un système d'extraction d'air vers l'extérieur
- ✓ 16 Patères
- ✓ 16 Places assises
- ✓ 1 accès direct à la douche depuis les vestiaires

SANITAIRES



Local entretien

- ✓ 4 mitigeurs alimentés en eau potable à température réglable
- ✓ 1 WC équipé d'un point d'eau
- ✓ 1 à 2 urinoirs
- ✓ 1 douche, communiquant directement avec les vestiaires et comportant un sas de déshabillage équipé d'un siège, de patères, et d'un chauffage rapide
- ✓ 1 local dédié à l'entreprise de nettoyage.

MODULES COMPLÉMENTAIRES



✓ Locaux pour le personnel féminin

✓ Salle de réunion

✓ Bureau du chef de chantier et de l'encadrement



RAFRAÎCHISSEMENT DES LOCAUX



Équiper les réfectoires et les bureaux d'un système de climatisation pour rafraîchir l'air



AMÉLIORATIONS

Aménagements, Équipements techniques & Organisation



14 Cuisine aménagée



Base vie équipée d'un lave-linge



Gestion des vêtements de travail



Détecteur de présence



Coffre-fort



Programmateur de chauffage

Crédits photos @Cramif

AMÉLIORATIONS COVID-19



FEUILLE D'EMARGEMENT
NETTOYAGE DE BASE VIE R+2

DATE	HEURE DE PASSAGE	SIGNATURE
27-10-2021	8h 15-13h 15	R. B. R. B.
28-10-2021	8h 15.	R. B.

NOMBRE DE MODULES EN FONCTION DE L'FFECTIF

Nombre de salariés	Nombre de modules	Détails
1 à 8	3 Modules	1 Vestiaire - 1 Sanitaire - 1 Réfectoire
9 à 16	5 Modules	2 Vestiaires - 1 Sanitaire - 2 Réfectoires
17 à 24	8 Modules	3 Vestiaires - 2 Sanitaires - 3 Réfectoires
25 à 32	10 Modules	4 Vestiaires - 2 Sanitaires - 4 Réfectoires
33 à 40	13 Modules	5 Vestiaires - 3 Sanitaires - 5 Réfectoires
41 à 48	15 Modules	6 Vestiaires - 3 Sanitaires - 6 Réfectoires
...		...

NOMBRE DE MODULES EN FONCTION DE L'EFFECTIF



Fiche de bonnes pratiques

BASE VIE / CANTONNEMENTS MODULAIRES

(CRAMIF Antenne 91 version du 23/03/2021)

(Avec protocoles COVID-19, le cas échéant : cf guide CRPSTP)

BASE VIE COMMUNE POUR L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES (REFECTOIRES, VESTIAIRES ET SANITAIRES RELIES)

EFFECTIF PREVISIONNEL A RENSEIGNER SUIVANT PGC 16 salariés

Votre base vie sera dimensionnée pour

Nombre de modules * :

* Module standard 6,27m * 2,44m

16 salariés

5 pour une surface équivalente d

74 m² d'emprise environ

REFECTOIRE

3 personnes / module (1,5 m²/personne)

Qté modules **2**

Equipements à prévoir:

- 4 tables (2 par modules)
- 16 chaises (8 par modules)
- 2 évier (s) alimenté (s) en eau potable à température réglable (1 par module)
- 2 équipement électrique (s) : plaque chauffante + micro-ondes + chauffe gamelles + réfrigérateur (1 par module)
- 2 rangement (s) (1 par module)

SANITAIRES

10 personnes / module (0,75 m²/personne)

Qté modules **1**

Equipements à prévoir:

- 2 lavabos (2 par module) alimentés en eau potable à température réglable entraxe > 0,70 m, profondeur > 0,40 m - savon et moyen de séchage
- 1 cabinet (s) à la turque (1 par module) équipés d'un point d'eau
- 2 urinoirs raccordés aux réseaux d'eau et d'assainissement (2 par module)
- 1 douche (s) à parois opaques (1 par module) avec receveur > 0,80x0,80m, communiquant directement avec les vestiaires et comportant un sas de déshabillage (> 1,00 x 0,80m) équipé d'un siège, de patères et d'un chauffage rapide

(onduleur sanitaire féminin indépendant si nécessaire)

VESTIAIRES

8 personnes / module (1,5 m²/personne)

Qté modules **2**

Equipements à prévoir:

- 16 armoires doubles (8 par module) double compartiments avec un emplacement pour chaussures de sécurité, ventilées avec un système d'extraction d'air vicié pour le séchage des vêtements + bottes.
- 16 places assises (8 par module)
- 16 patères (8 par module)
- 16 coffres individuels (8 par module)


(onduleur ventilateur féminin indépendant si nécessaire)

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES LOCAUX DE CANTONNEMENT

- Privilégier les installations modulaires aux installations dans l'existant du début à la fin du chantier ;
- Mettre en place une structure porteuse des bungalows comprenant des contreventements si nécessaire ;
- Prévoir un accès piéton indépendant viabilisé (cheminement en dur, éclairé, séparé des engins) donnant directement sur l'extérieur du chantier ;
- Mettre en place des escaliers métalliques d'accès aux bungalows en étage, et un ascenseur si plus de 4 niveaux ;
- S'assurer que les portes d'accès s'ouvrent vers l'extérieur ;
- Prévoir des fenêtres ouvrantes (éclairage naturel) et un éclairage artificiel atteignant un niveau moyen de 100 lux et à minima de 120 lux au sol ;
- Garantir une température de 18°C au minimum dans le réfectoire, et de 20°C dans les autres locaux ;
- Assurer le renouvellement en air neuf par une ventilation mécanique ;
- Utiliser des chauffe-eau électriques pour produire l'eau chaude : 50°C aux points de puisage et >60°C dans les équipements de stockage ;
- Prévoir des revêtements de sol et des parois permettant un nettoyage facile et efficace ;
- Prévoir une armoire dédiée au stockage des produits d'entretien ainsi qu'un déversoir pour évacuer les eaux de nettoyage ;
- Installer des sanitaires chimiques et lave-mains sur les zones de travaux à l'avancement du chantier ;
- Mettre en place la protection incendie selon réglementation ou avis service de pompier : stabilité au feu, signalisation et éclairage de sécurité, alarme sonore audible en tout point, au moins un extincteur par bungalows (révisé, visible et accessible) et affichage des consignes de sécurité ;
- Confier le nettoyage quotidien des cantonnements à une entreprise extérieure.

MISE EN ŒUVRE

- Raccorder les installations au réseau public de distribution électrique ;
- Raccorder les équipements sanitaires aux réseaux d'eau et public avec un débit et une pression suffisante ;
- Concevoir l'alimentation et l'évacuation des fluides pour être hors gel si possible en passant par l'intérieur des bungalows ;
- Assurer la maintenance et la vérification de l'installation électrique (initiale, annuelle et à chaque modification) ;
- Concevoir les installations pour permettre toutes les opérations (élingage, désélingage, raccordements) depuis le sol ou depuis l'intérieur des modules ; à défaut équiper tout le périmètre de la toiture de dispositifs de protection collective tels qu'un garde-corps ;
- Pour les interventions ultérieures, maintenir sur le périmètre des toitures des garde-corps fixes et rigides et aménager un accès par escalier.



Plan type
- 5 modules
- 16 salariés



Vestiaire
Armoires doubles
ventilées
extraction air vicié
Accès douche
Bancs + patères

Pour en savoir plus

N° CRAMIF n° 27
Cantonnements de chantier

INRS D11
Installations sanitaires des entreprises

17


l'Assurance Maladie
 RISQUES PROFESSIONNELS

Caisse régionale Ile-de-France

EN CONCLUSION

Le bon accueil des salariés dépend :

- de la présence de la base vie tout au long du chantier,
- des aménagements décrits dans la présentation,
- de sa capacité d'accueil.

La gestion de la base vie doit être définie, planifiée et organisée dès le début du chantier. Elle doit être contractualisée dans les pièces marchés (CCTP, PGC) passées avec des entreprises spécialisées en particulier pour :

- le nettoyage quotidien,
- la fourniture des consommables,
- la maintenance technique.

Cette disposition est favorable à l'atteinte d'un niveau d'hygiène comparable à celui rencontré dans les chantiers réalisés en entreprise générale.

POINTS À RETENIR

PREPARATION / INSTALLATIONS DE CHANTIER

- ✓ Préparation administrative des travaux,
- ✓ Installations de chantiers permanentes,
- ✓ Installations de chantier évolutives, PIC évolutif,

INSTALLATIONS D'HYGIÈNE, BASE VIE MODULAIRE

- ✓ Présence de la base vie dès le démarrage des travaux jusqu'à la livraison,
- ✓ Nettoyage quotidien et maintien en bon état de la base vie,
- ✓ Gestion de la base vie par une ressource désignée et connue de tous,

RISQUE CHIMIQUE SUR VOS CHANTIERS

- ✓ L'hygiène est incontournable pour réduire l'exposition aux risques chimiques,
- ✓ Réduire l'exposition des salariés au niveau le plus bas techniquement possible,
- ✓ Réduire l'exposition des salariés au niveau le plus bas techniquement possible,

